EPET N20

Sistemas de Gestion de Calidad de Software



Docente: Alejandro Zeballos

Scrum Master: Ainara Rosales

Tester: Mayra Fritz


Diseñadora: Lucia Rosales

Programadora: Morena Godoy

Análisis de desviación

Introducción del gráfico:

Eje X: días hábiles desde el inicio del Sprint (07/09/2026). Eje Y: tareas pendientes. Cada historia de usuario tiene tres tareas (diseño, programación y pruebas), lo que da un total de 15, porque la Definición de Hecho exige que las tres estén cumplidas. La línea ideal es la proyección de descenso constante hasta cero el 23/09/2026; la línea real refleja las tareas efectivamente terminadas.

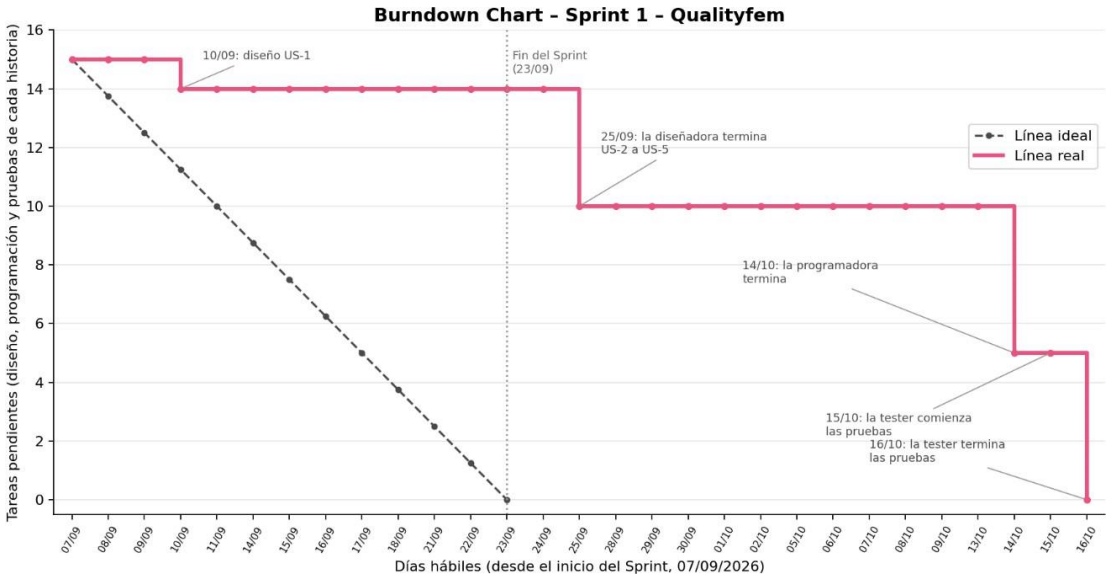

Al finalizar el período planificado (23/09/2026) quedaban 14 de las 15 tareas pendientes, frente a 0 en la proyección ideal. Solo estaba terminado el diseño de US-1 (10/09). La diseñadora completó las vistas restantes el 25/09, luego de presentar la US-5 al Product Owner el 24/09 y realizar las correcciones solicitadas.

La programación dependía de las vistas aprobadas, por lo que avanzó de manera parcial desde el 15/09 y recién se terminó el 14/10. A esto se sumaron ausencias en algunas reuniones (la programadora el 10/09, 11/09 y 25/09; la Scrum Master el 11/09), inconvenientes de organización del equipo y la planificación en torno a la fecha de examen del 02/10. El plan de pruebas se fue elaborando durante el Sprint, pero su ejecución comenzó recién el 15/10, cuando hubo código terminado para probar, y se completó el 16/10.

Las caídas bruscas de la línea real (10/09, 25/09, 14/10 y 16/10) se deben a que el trabajo se cerró en bloques y no de forma progresiva: cada etapa dependía de la anterior (diseño aprobado, programación y pruebas), por lo que los retrasos se acumularon. Los estancamientos más largos fueron entre el 10/09 y el 25/09 (diseño y aprobaciones) y



entre el 25/09 y el 14/10 (programación). En consecuencia, el Sprint se cerró el 16/10, más de tres semanas después de la fecha planificada.
